

# 通 知


中華民國 112 年 8 月 7 日

聯絡人: 李駿宏

聯絡電話: 2717131

本校「國立嘉義大學民雄校區校園通訊整合服務」自 112 年 7 月 26 日起至 112 年 12 月 21 日於民雄校區進行通訊系統汰舊換新作業，檢附本案施工廠商人員識別證、施工及監造廠商資料、施工期程預估表，惠請各單位協助廠商施工並注意安全，如有疑義之處請通知總務處營繕組處理。

★本案施工廠商識別證如下：

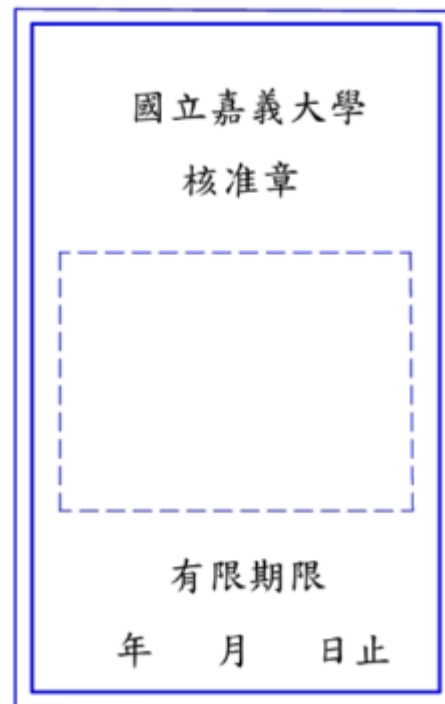

★本工程委託監造及施工廠商資料如下：

廠商類別	名稱	聯絡人	聯絡電話	備註
施工廠商	中華電信股份有限公司企業客戶分公司	李勝益	0910-372-400	
監造單位	明積電機技師事務所	黃淨林	0932-233-455	

此 致

本校各單位



總務處營繕組 敬啟

★本工程施工期程預估表如下：

週別	日期	施作項目	日期	預定施作範圍	
第一週	7/25 至 7/31	開工前協調會及 施工前準備作業			
第二週	8/1	探管及管線位置記錄	8/1~7	全校區	
	至	水線預留及管線清淤作業			
	8/7	圖面繪製及管線編碼			
第三週	8/8	水線預留及管線清淤作業	8/8~14	全校區	
	至	圖面繪製及管線編碼			
	8/14	跨棟水平幹纜佈建			
第四週	8/15	各棟垂直幹纜佈建	8/15	初等教育館至行政大樓	
	至		8/16~	教育館、圖書館、女生宿舍、 男生宿舍至行政大樓	
8/21	8/21				
第五週	8/22		8/22~	8/28	藝術館、音樂館、創意樓、大 學館、人文館、 科學館至行政大樓
	至				
第六週	8/29	8/29~31	9/1~4	行政大樓 初等教育館、圖書館	
	至				
第七週	9/4	9/5~6	9/7~9/11	初等教育館、圖書館 綠園一舍、綠園二舍、學人館	

週別	日期	施作項目	日期	預定施作範圍
	9/5 至 9/11			
第八週	9/12 至 9/18	末端水平線路佈建末端接線盒	9/12~13	科學館
			9/14~18	人文館
第九週	9/19 至 9/25	末端水平線路佈建末端接線盒	9/19	大學館
			9/20~25	創意樓
第十週	9/26 至 10/2	末端水平線路佈建末端接線盒	9/26~29	教育館
			9/30~10/2	值勤室、工友室
第十一週	10/3 至 10/9	末端水平線路佈建末端接線盒	10/3	新藝樓
			10/4~6	音樂館
			10/7~9	藝術館
第十二週	10/10 至 10/16	末端水平線路佈建末端接線盒	10/10~13	藝術館
			10/14~16	樂育堂
第十三週		末端水平線路佈建末端接線盒	10/17~22	樂育堂

週別	日期	施作項目	日期	預定施作範圍
	10/17 至 10/23			
第十四週	10/24 至 10/30	線路切換作業、話機定位 測通作業	10/24~30	行政大樓、初教館、圖書館 教育館
第十五週	10/31 至 11/6	線路切換作業、話機定位 測通作業	10/31~11/6	科學館、大學館、人文館 創意樓、音樂館、新藝樓
第十六週	11/7 至 11/13	線路切換作業、話機定位 測通作業	11/7~11/13	綠園一舍、綠園二舍、學人館 樂育堂、工友室、警衛室
第十七週	11/14 至 11/20	教育訓練	11/14~20	第一場
第十八週	11/21 至 11/27	教育訓練	11/21~27	第二場
第十九週		竣工圖說及校正	11/28~12/4	

週別	日期	施作項目	日期	預定施作範圍
	11/28 至 12/4			
第二十週	12/5 至 12/11	驗收及改善作業	12/5~11	
第二一週	12/12 至 12/18	驗收	12/12~18	
