

通 知

中華民國 112 年 8 月 24 日


聯絡人: 李駿宏

聯絡電話: 2717131

本校「國立嘉義大學民雄校區校園通訊整合服務」將於 8/28~9/1 藝術館與音樂館進行舊系統線路汰換，造成通訊不穩或短時間中斷，敬請見諒。

檢附本案施工廠商人員識別證、施工及監造廠商資料、施工工期預估表，惠請民雄校區各單位協助廠商施工並注意安全，如有疑義之處請通知總務處營繕組處理。

★本案施工廠商識別證如下：

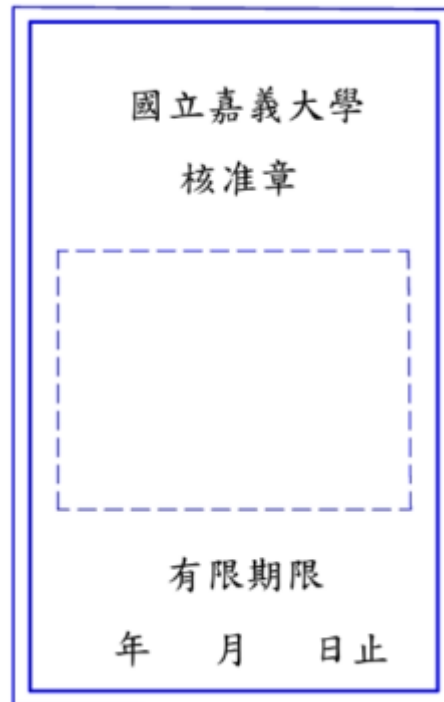

★本工程委託監造及施工廠商資料如下：

| 廠商類別 | 名稱 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 備註 |
|------|-------------------|-----|--------------|----|
| 施工廠商 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 李勝益 | 0910-372-400 | |
| 監造單位 | 明積電機技師事務所 | 黃淨林 | 0932-233-455 | |

★本工程施工工期程預估表如下：

| 週別 | 日期 | 施作項目 | 日期 | 預定施作範圍 |
|------|----------------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 第一週 | 7/25 至 7/31 | 開工前協調會及 施工前準備作業 | | |
| 第二週 | 8/1 | 探管及管線位置記錄 | 8/1~7 | 全校區 |
| | 至 | 水線預留及管線清淤作業 | | |
| | 8/7 | 圖面繪製及管線編碼 | | |
| 第三週 | 8/8 | 水線預留及管線清淤作業 | 8/8~14 | 全校區 |
| | 至 | 圖面繪製及管線編碼 | | |
| | 8/14 | 跨棟水平幹纜佈建 | | |
| 第四週 | 8/15 | 各棟垂直幹纜佈建 | 8/15 | 初等教育館至行政大樓 |
| | 至 | | 8/16~ | 教育館、圖書館、女生宿舍、 男生宿舍至行政大樓 |
| 8/21 | 8/21 | | | |
| 第五週 | | | 8/22~ | 藝術館、音樂館、創意樓、大 學館、人文館、 科學館至行政大樓 |
| | | | 8/28 | |

| | | | | |
|------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 8/22 至 8/28 | | | |
| 第六週 | 8/29 至 9/4 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 8/29~31 | 行政大樓 |
| | | | 9/1~4 | 初等教育館、圖書館 |
| 第七週 | 9/5 至 9/11 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 9/5~6 | 初等教育館、圖書館 |
| | | | 9/7~9/11 | 綠園一舍、綠園二舍、學人館 |
| 第八週 | 9/12 至 9/18 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 9/12~13 | 科學館 |
| | | | 9/14~18 | 人文館 |
| 第九週 | 9/19 至 9/25 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 9/19 | 大學館 |
| | | | 9/20~25 | 創意樓 |
| 第十週 | 9/26 至 10/2 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 9/26~29 | 教育館 |
| | | | 9/30~10/2 | 值勤室、工友室 |
| 第十一週 | 10/3 至 10/9 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 10/3 | 新藝樓 |
| | | | 10/4~6 | 音樂館 |
| | | | 10/7~9 | 藝術館 |

| | | | | |
|------|------------|---------------------|------------|------------------------------|
| 第十二週 | 10/10 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 10/10~13 | 藝術館 |
| | 至 10/16 | | 10/14~16 | 樂育堂 |
| 第十三週 | 10/17 | 末端水平線路佈建末端接線盒 | 10/17~22 | 樂育堂 |
| | 至 10/23 | | | |
| 第十四週 | 10/24 | 線路切換作業、話機定位 測通作業 | 10/24~30 | 行政大樓、初教館、圖書館 教育館 |
| | 至 10/30 | | | |
| 第十五週 | 10/31 | 線路切換作業、話機定位 測通作業 | 10/31~11/6 | 科學館、大學館、人文館 創意樓、音樂館、新藝樓 |
| | 至 11/6 | | | |
| 第十六週 | 11/7 | 線路切換作業、話機定位 測通作業 | 11/7~11/13 | 綠園一舍、綠園二舍、學人館 樂育堂、工友室、警衛室 |
| | 至 11/13 | | | |
| 第十七週 | 11/14 | 教育訓練 | 11/14~20 | 第一場 |
| | 至 11/20 | | | |
| 第十八週 | 11/21 | 教育訓練 | 11/21~27 | 第二場 |
| | 至 11/27 | | | |

| | | | | |
|------|---------------------|---------|------------|--|
| 第十九週 | 11/28 至 12/4 | 竣工圖說及校正 | 11/28~12/4 | |
| 第二十週 | 12/5 至 12/11 | 驗收及改善作業 | 12/5~11 | |
| 第二一週 | 12/12 至 12/18 | 驗收 | 12/12~18 | |

此 致

本校各單位



總務處營繕組 敬啟
